ЛЕКЦИЯ 3 • ДЕФИНИРАНЕ НА ИТ ПРОЕКТ

Приоритетна матрица на ИТ проект

Време, разходи и обхват: какво фиксираме, какво оптимизираме и къде правим компромис

Технически университет – София • Управление на проекти • Упражнение

Съдържание

Сценарий 1: мобилно приложение за управление на лични финанси

01 **Проектът: жизнен цикъл, SWOT анализ и SMART цели**

02 **Приоритетна матрица и обосновка на приоритетите**

03 **Компромиси, стратегия за контрол и разпределение на работата**

04 **Изводи**

01 • ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ

Жизнен цикъл на проекта

Пет фази в рамките на фиксираните 6 месеца

СЕДМИЦА 1–2

Иницииране

- Цели и обхват
- Заинтересовани страни
- Приоритетна матрица
- Одобрение от спонсора

СЕДМИЦА 3–4

Планиране

- Разпределение на работата
- Бюджет и график
- Рискове
- Комуникационен план

МЕСЕЦ 2–5

Изпълнение

- Дизайн и разработка
- Връзка с банкови API
- Тестове
- Бета версия

ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ПРОЕКТ

Мониторинг и контрол

- Седмични статус отчети
- Искания за промяна
- План и факт по бюджета

МЕСЕЦ 6

Закриване

- Публикуване в магазините
- Документация и обучение
- Извлечени уроци

Връзка с приоритетите: срокът е фиксиран, затова фазите имат ясни ключови етапи (MVP в м.3, бета в м.5, пускане в м.6), а мониторингът тече паралелно с всички останали фази.

SWOT анализ

Вътрешни сили и слабости, външни възможности и заплахи

Силни страни

- Анализ на разходите, а не само записването им
- Автоматична връзка с банковите сметки
- Екип с опит в мобилната разработка

Слаби страни

- Нова марка, все още без потребители
- Ограничен бюджет и твърд срок
- Зависимост от външни банкови API

Възможности

- Въвеждането на еврото кара хората да преосмислят бюджета си
- Отворено банкиране в ЕС (PSD2)
- Растящ интерес към финансова грамотност

Заплахи

- Банкови приложения и необанки с вградени анализи
- Строги изисквания за сигурност и GDPR
- Ниско доверие при споделяне на финансови данни

SMART цели на проекта

Какво точно трябва да постигнем и как ще го измерим

1. Пускане на версия 1.0

Публикувана в App Store и Google Play с всички „Must“ функции до края на месец 6, при разходи до 60 000 €.

2. Потребители

10 000 изтегляния и 3 000 активни потребители месечно до 3 месеца след пускането.

3. Качество и сигурност

Средна оценка поне 4,5 в магазините и нито един сериозен пробив в сигурността през първите 6 месеца.

Проверка на цел 1 по SMART:

S
Конкретна: версия 1.0 в двата магазина

M
Измерима: всички „Must“ функции работят

A
Постижима: бюджет с резерв и 2 седмици буфер

R
Уместна: хората планират бюджета си в началото на годината

T
Със срок: края на месец 6

Три критерия, три роли

Всеки от критериите време, разходи и обхват получава точно една роля

Фиксиран (Constrain)

Не подлежи на промяна. Проектът трябва да го спази, дори с цената на компромис при другите два.

Оптимизиран (Enhance)

Подобряваме го, доколкото е възможно, без сериозно да нарушаваме другите два критерия.

Допустим компромис (Accept)

Може да се отклони от плана, ако това е нужно, за да се запазят другите два.


Как отговаряме на въпросите от упражнението за нашия сценарий

- **Матрица и обосновка:** кой критерий е фиксиран, кой се оптимизира и при кой допускаме компромис, и защо.
- **Компромиси:** какво конкретно жертваме, колко и в замяна на какво.
- **Стратегия за контрол:** как следим, че проектът остава в рамките на зададените приоритети.

02 • МАТРИЦА

Мобилно приложение за лични финанси

Срок 6 месеца • бюджет 50 000 € • фокус върху анализа на личните финанси

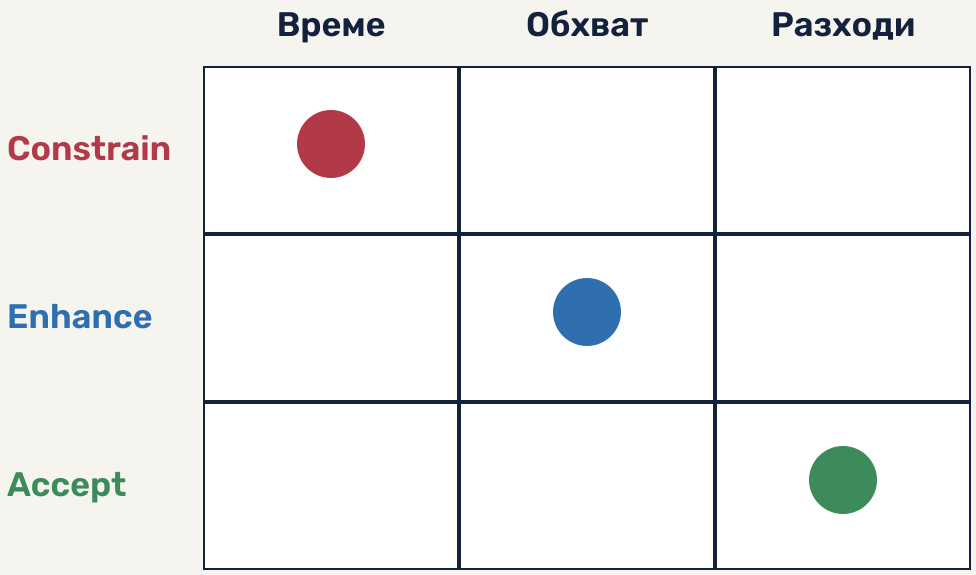

Фиксирано **Време: 6 месеца**

Пазарът на финансови приложения е конкурентен. Пускането е обвързано с началото на годината, когато хората планират бюджета си. Закъснението означава загубени потребители.

Оптимизирано **Обхват: функциите за анализ**

Анализът на разходите отличава продукта от конкурентите. Добавяме колкото повече стойност може в срока.

Компромис **Разходи: 50 000 €**

Обосновано превишение е по-евтино от пропуснат пазарен прозорец.

03 • КОМПРОМИСИ

Какви компромиси правим и защо

Срокът е твърд, затова обхватът се приоритизира, а бюджетът поема рисковете

Бюджет: до +20% (до 60 000 €)

- Допълнителен разработчик в месеци 3–4, ако разработката изостава: ~6 000 €
- Платен агрегатор на банкови API (PSD2) вместо собствена интеграция със всяка банка: ~3 000 €
- Всяко превишение над 50 000 € се одобрява от спонсора

Обхват: MoSCoW приоритизация

- **Must:** следене на разходи, категории, месечен бюджет, връзка с банка
- **Should:** графики и тенденции, известия при превишен бюджет
- **Could:** AI съвети за спестяване, цели за спестяване
- **Won't (v1):** инвестиции, споделени семейни сметки, уеб версия

Ключов компромис: ако срокът е застрашен, функциите от „Could“ се отлагат за версия 1.1. Срокът не се мести. Качеството и сигурността на финансовите данни също не се жертват.

Стратегия: как оставаме в приоритетите

Контрол, насочен към фиксирания критерий: времето

Контрол на времето

- Двуседмични спринтове с фиксирана дата на пускане
- Ключови етапи: дизайн (м.1), MVP (м.3), бета (м.5), пускане (м.6)
- Буфер от 2 седмици преди пускането

Управление на обхвата

- Подреден по приоритет списък със задачи (Product backlog)
- Всяка нова идея минава през искане за промяна (change request)
- Нова функция влиза само ако друга излезе

Наблюдение на разходите

- Месечен отчет: план и факт по работни пакети
- Праг за ескалация: отклонение над 10%
- Таван 60 000 €, решение от спонсора

Комуникация: седмичен статус отчет към екипа и клиента, доклад за ключов етап към ръководството, регистър на рисковете (банкови API, одобрение в App Store / Google Play).

Структура на разпределение на работата

Работни пакети, отговорници и разпределение на бюджета

1. Мобилно приложение за управление на лични финанси • 50 000 €

2.1 Проектиране

6.1 Дизайн на интерфейса

6 000 € • м.1

2.2 Основни функции

6.2 Кодиране на следенето на разходите

18 000 € • м.2–4

2.3 Финансови API

6.3 Интеграция с банкови услуги

9 000 € • м.3–4

2.4 Тестване

6.4 Функционални тестове и тестове за сигурност

7 000 € • м.4–5

2.5 Пускане

Публикуване в магазините, мониторинг

3 000 € • м.6

3.1 Документация

6.5 Документация за потребителите

2 500 €

3.2 Обучение

Обучение на екипа

1 500 €

Отговорници и работни пакети

4.1 Проектиране (UX дизайнер) • 4.2 Разработка (Tech lead) • 4.3 Тестване (QA lead). Работните пакети 5.1–5.3 са групирани по същите три направления. Резерв за рискове: 3 000 €.

04 • ИЗВОДИ

Какво научихме

Приоритетната матрица превръща спора „всичко е важно“ в ясни решения

1. Само един критерий е фиксиран

Ако всичко е фиксирано, няма къде да се поеме рискът. Матрицата казва предварително кое се жертва първо.

2. Компромисът има граница

„Допустим“ не значи „неограничен“. Задаваме праг (+20%, таван 60 000 €) и кой одобрява превишението.

3. Контролът следва приоритета

Най-строгите проверки стоят върху фиксирания критерий: ключовите етапи и фиксираната дата на пускане.

4. Матрицата се договаря с клиента

Тя е част от обхвата и се преглежда с клиента и спонсора, преди да се изготви структурата на разпределение на работата.

Благодарим!

Въпроси и дискусия
